

# مسجد الأتباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

## مشروع

نسبة الإنجاز  
حتى تاريخ  
(12 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (ديسمبر) لعام (2025م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م <sup>2</sup>	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م <sup>2</sup>	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 22م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / ديسمبر)



## مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

## مؤشر انجاز بنود الاعمال

الفحص  
والاعتماد

اعمال  
الخدمات

اعمال  
التأثيث

اعمال  
التشطيب

اعمال  
العظم

إصدار  
التراخيص

التعاقد مع  
المكتب  
الهندسي

التعاقد مع  
المقاول

ترسية  
المشروع

طلب  
عروض  
السعر

مراجعة  
التصاميم

مراجعة  
المخططات

يحدث الآن

## أعمال العظم

أعمال  
الأسقف

أعمال  
الجسور

أعمال  
المباني

أعمال  
الأعمدة

صبة نظافة  
الأرضية

أعمال  
الردم

أعمال  
العزل

أعمال  
الميدات

أعمال  
رقاب  
الأعمدة


خرسانة  
القواعد

الخرسانة  
العادية


أعمال  
الحفر  
والإحلال

يحدث الآن

- 01 الانتهاء من صب سقوف المسجد.
- 02 تم الانتهاء من مباني سكن الامام والمؤذن للطابق الارضي.
- 03 الانتهاء من نجارة وحدادة سقوف المحلات.
- 04 الانتهاء من أعمال الكمرات المقلوبة اعلى المسجد.

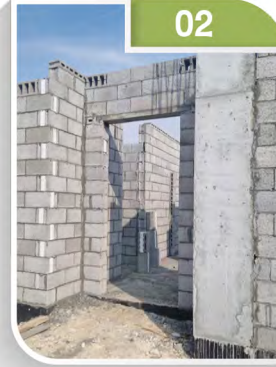

- 01 أعمال السقف الخرساني للمحلات.
- 02 أعمال حدادة ونجارة سقف الطابق الارضي لسكن الامام والمؤذن.
- 03 أعمال مباني المسجد.
- 04 بداية اعمال الكهرباء و الميكانيكا للمسجد.

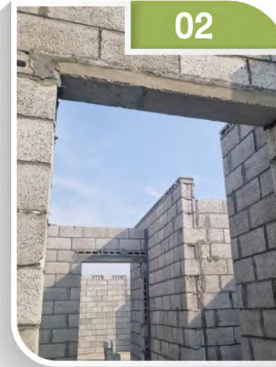

الموقع  
الجغرافي  
للمشروع



رابط البث  
المباشر  
للمشروع



اضغط هنا
