

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(12 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (ديسمبر) لعام (2025 م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م ²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334 م ²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 12 م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 18 م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / ديسمبر)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميم مراجعة السعر طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم


يحدث الآن

أعمال العظم

أعمال الحفر والإحلال الخرسانة العادية الخرسانة القواعد أعمال رقاب الأعمدة أعمال الميدات أعمال العزل أعمال الردم صبة نظافة الأرضية الأعمال الأعمدة الأعمال المبنائي الجسور الأسقف

يحدث الآن

- 01 **الأعمال التي تم** الانتهاء من حجارة ونجارة رقاب الجدار الخرساني للمسجد.
- 02 **الإنهاء منها** انتهاء اعمال مبنائي فيلا الامام والمؤذن.
- 03 **خلال الـ 30 يوم** أعمال نجارة سقف الطابق الارضي لسكن الامام والمؤذن.
- 04 **الماضية** أعمال خرسانة الجدار الخرساني.

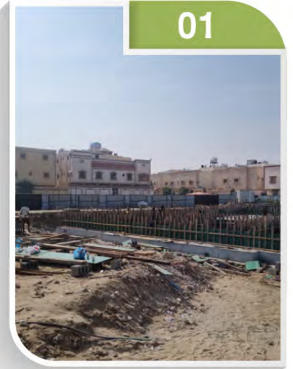

- 01 **الأعمال الجاري** صب حجارة سقف سكن الامام والمؤذن.
- 02 **تنفيذها خلال** صب أعمال حجارة المحلات.
- 03 **الشهر الحالي** أعمال عزل رقاب الجدار الخرساني للمسجد.
- 04 **(الـ 30 يوم القادمة)** الانتهاء من البلاطة الارضية للمحلات.
- 05 **أعمال حفر وتجهيز المئذنة.**



الموقع
الجغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
