

# جامع الضباط

الدمام - إسكان الدمام الشمالي

## مشروع

نسبة الإنجاز  
حتى تاريخ  
(01/31)



تقرير سير الأعمال لشهر (يناير) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	5194 م <sup>2</sup>	عدد المواقف	38
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1352.25 م <sup>2</sup>	عدد دروات المياه	9
إجمالي عدد المصلين التقريبي	850.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

12 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 6 / 10م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 15م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / يناير)



## مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية



## مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميمات طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم

يحدث الآن

## أعمال العظم


أعمال الحفر والإحلال الخرسانة العادية الخرسانة القواعد أعمال رقاب الأعمدة أعمال الميدات أعمال العزل أعمال الردم صبة نظافة الأرضية الأعمال الأعمدة الأعمال الجسور الأعمال المباني الأسقف

يحدث الآن

- 01 الانتهاء من صب أعمدة السكن (الطابق الأرضي).
- 02 الانتهاء من صب خرسانة أعمدة المستوى الثاني للمسجد.
- 03 الانتهاء من صب أعمدة المحلات ودورات المياه.
- 04 حدادة ونجارة أسقف الخدمات ومصلى النساء في الجامع.



- 01 الانتهاء من صب أسقف الجامع.
- 02 الانتهاء من صب سقف الطابق الأرضي في الفل.
- 03 الانتهاء من صب اسقف مبنى دورات المياه والمحلات.
- 04 أعمال المبانى في الجامع.

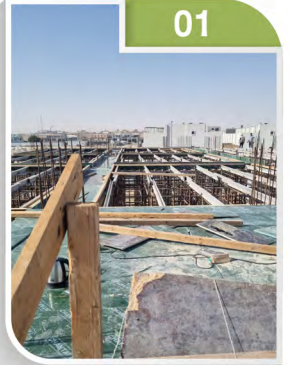

الموقع  
الجغرافي  
للمشروع



رابط البث  
المباشر  
للمشروع

اضغط هنا
