

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(11/30)



تقرير سير الأعمال لشهر (نوفمبر) لعام (2025م)

31	عدد المواقف	3776.6 م²	إجمالي مساحة المشروع (الأرض)
6	عدد دروات المياه	908.00 م³	إجمالي مساحة المشروع (المباني)
2	عدد المحلات الوقفية	390.00	إجمالي عدد المصليين التقريري

مدة المشروع
14 شهرًا



تاريخ نهاية المشروع
2026 / 8 / 22 م



تاريخ بداية المشروع
2025 / 6 / 28 م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / نوفمبر)



مكونات المشروع



- ☑ مبنى المسجد ومرافقه
- ☑ سكن للإمام
- ☑ سكن للمؤذن
- ☑ مراافق خضراء
- ☑ مواقف سيارات
- ☑ محلات تجارية وقفية

الفحص
والتسليم

اعمال
الخدمات

اعمال
التأثير

اعمال
التشطيب

اعمال
العظم

إصدار
التراخيص

التعاقد مع
المكتب
الهندسي

التعاقد مع
المقاول

ترسيمة
المشروع

طلب
عرض السعر

مراجعة
التعاميم

مراجعة
المخططات

يحدث الان

أعمال العظم

اعمال
الأسقف

اعمال
الجسور

اعمال
المباني

اعمال
الأعمدة

صبة نظافة
الأرضية

اعمال
الردم

اعمال
العزل

اعمال
الميدان

اعمال
رقاب
الأعمدة

خرسانة
القواعد

الخرسانة
العادية

اعمال
الحفر
والإحلال

يحدث الان

- الأعمال التي تم 01 صب الأعمدة للمبني المسجد (الطابق الأرضي)**
- الانتهاء منها 02 من صب خرسانة البلاطات الأرضية في سكن الإمام والمؤذن**
- الانتهاء من صب 03 أعمدة المدارات خلال الـ 30 يوم**
- الانتهاء من صب أعمدة لسكن الإمام والمؤذن (الطابق الأرضي) 04 الماضية**




04



03



02

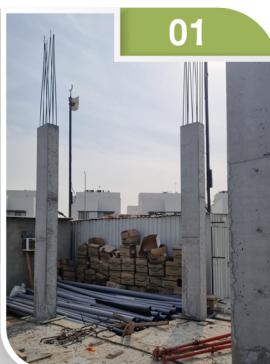

01

- أعمال الس 01 ف للمسجد**
 - أعمال المباز 02 ي للسكن (الطابق الأرضي)**
 - أعمال الس 03 ف للمساجد**
 - أعمال نجارة وحدادة وصب خرسانة الأرضيات 04 والأكتاف للطابق الأرضي في سكن المؤذن والإمام**
- الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)**



04



03



02



01



الموقع
الغرافي
للمشروع



رابط الـ
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
