

جامع الضباط

الدمام - إسكان الدمام الشمالي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(11/30)

17.06
%

تقرير سير الأعمال لشهر (نوفمبر) لعام (2025م)

38	عدد المواقف	5194 م²	إجمالي مساحة المشروع (الأرض)
9	عدد دروات المياه	1352.25 م²	إجمالي مساحة المشروع (المباني)
2	عدد المحلات الوقفية	850.00	إجمالي عدد المصليين التقريري

مدة المشروع
12 شهراً



تاريخ نهاية المشروع
2026 / 6 / 10 م



تاريخ بداية المشروع
2025 / 6 / 15 م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / نوفمبر)



مكونات المشروع



- ☑ مبنى الجامع ومرافقه
- ☑ سكن للإمام
- ☑ سكن للمؤذن
- ☑ مراافق خضراء
- ☑ مواقف سيارات
- ☑ محلات تجارية وقفية

يحدث الان

اعمال العظم

يحدث الان

- الأعمال التي تم الإنتهاء من صب البلاطة الأرضية للمسجد**
- الانتهاء من الدفان حول الميدة للسكن والمحلات ومبني دورات المياه
 - الانتهاء منها خلال الـ 30 يوم
 - الانتهاء من أعمال نجارة الماذنة (المراحلة الأولى فوق الأرض)
 - الانتهاء من أعمال الالكتروميكانيكا في الماذنة (المراحلة الأولى فوق الأرض)
- الماضية**




04



03



02

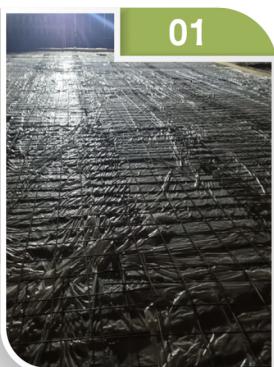

01

- الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي**
- الانتهاء من أعمال المذنة
 - الانتهاء من خرسانة البلاطة الأرضية للسكن البدء في أعمال الشدة المعدنية لاسقف المسجد والكمرة الرابطة
 - صب البلاطة الأرضية للمدارس (الـ 30 يوم القادمة)



04



03



02



01



الموقع
الغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
