

جامع الضباط

الدمام - إسكان الدمام الشمالي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(06 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (يونيو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	5194 م ²	عدد المواقف	38
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1352.25 م ²	عدد دروات المياه	9
إجمالي عدد المصلين التقريبي	850.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

12 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 6 / 10م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 15م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / يونيو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميمات طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم


يحدث الآن

أعمال العظم


أعمال الحفر والإحلال الخرسانة العادية الخرسانة القواعد أعمال رقاب الأعمدة أعمال الميدات أعمال العزل أعمال الردم صبة نظافة الأرضية الأعمال الأعمدة الأعمال الجسور الأعمال الأسقف أعمال المباني

يحدث الآن

- الأعمال التي تم الإنهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية**
- 01 الانتهاء من أعمال حدادة والكثروميكانكا سقف مصلى الرجال مع صب الخرسانة.
 - 02 أعمال حدادة ونجارة سقف الطابق الأول في الفل.
 - 03 أعمال حدادة جدران المستوى الثاني فوق الأرض للمئذنة.
 - 04 صب خرسانة الكمرات المقلوبة في سطح مصلى الرجال.

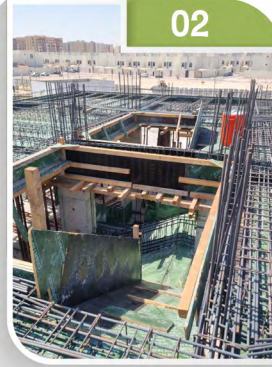

- الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)**
- 01 صب خرسانة الكمرات المقلوبة في أسطح مصلى النساء والمداخل.
 - 02 أعمال المباني في مبنى دورات المياه والمحلات.
 - 03 أعمال نجارة والكثروميكانكا وصب خرسانة جدران المستوى الثاني فوق الأرض للمئذنة.
 - 04 أعمال الكثروميكانكا وصب خرسانة سقف الطابق الأول في الفل.

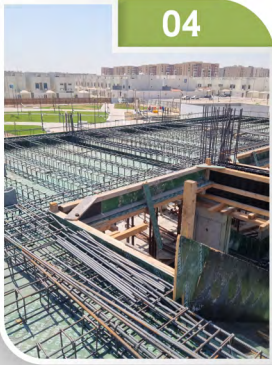

الموقع
الجغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
